



КС-1 «Алимтау»

04.06.2023 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ / THE ACT OF WORKS PERFORMED




Мы, нижеподписавшиеся: Начальник КС-1 Чжао Шэньцю, Заместитель начальника КС-1 Бакен Н., Ведущий инженер КС КС-1 Хасенов А., Ведущий инженер по эксплуатации КС-1 «Алимтау» Баккараев Т., составили настоящий акт о том, что 04.06.2023г. были проведены ниже следующие работы:

We, the undersigned: Head of CS-1 Zhao Shengqui, Deputy Head of CS-1 Baken N., Leading engineer CS of CS-1 A. Khassenov, Leading engineer on operation CS-1 T. Bakkarayev, compiled this act that 04.06.2023 the following works were carried out:

Оборудование / Equipment	Наименование работ / Name of works	Примечание / Note
CDP клапан (Bleed Valve) S/N GRTR7704 / CDP valve (Bleed Valve) S/N GRTR7704	1. Ревизия CDP клапана (Bleed Valve) / Revision of the CDP valve (Bleed Valve): - наружный осмотр корпуса и привода клапана / external inspection of the valve body and actuator; - демонтаж привода / dismantling of the drive; - демонтаж и инспекция элементов корпуса / dismantling and inspection of body elements; - инспекция штока и элементов поршневого затвора / inspection of the stem and elements of the piston valve; - обратная сборка всех элементов клапана после ревизии / reassembly of all valve elements after revision;	
В заключении / Conclusion	В результате проведенной ревизии (по механической части) выявлено следующее / As a result of the audit (on the mechanical part), the following was revealed: - износ тефлонового уплотнительного кольца поршневого затвора клапана, вследствие которого способствовало протечке синтетического масла через образовавшийся зазор между торцевой поверхностью поршневого затвора и внутренней поверхностью корпуса клапана, далее последовавшей в виде утечки через дренажный порт клапана / wear of the Teflon sealing ring of the piston valve plug, the consequence of which contributed to the leakage of synthetic oil through the resulting gap between the end surface of the piston valve and the inner surface of the valve body, which further followed in the form of leakage through the valve drain port;	

Предусмотрено приложение 1 с фотографиями / Appendix 1 with photos is provided

Приложение №1 / Appendix №1

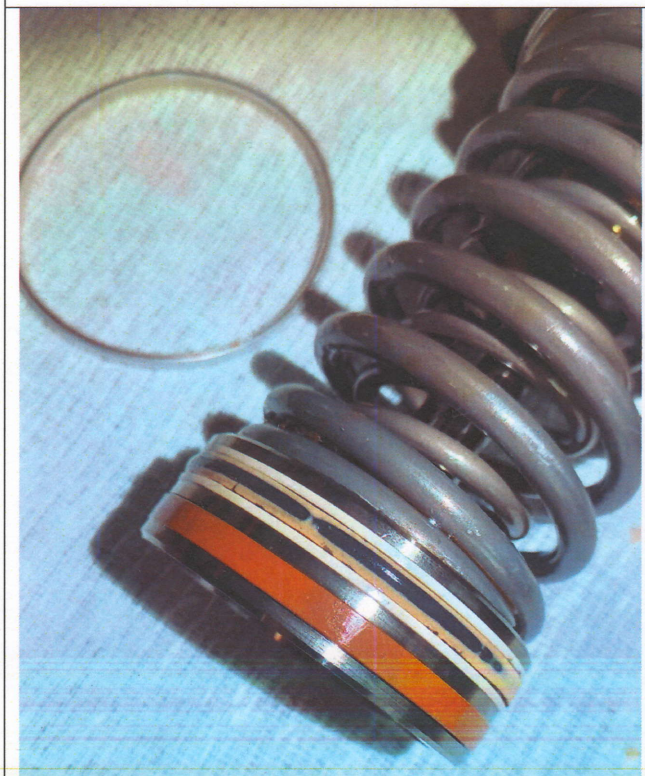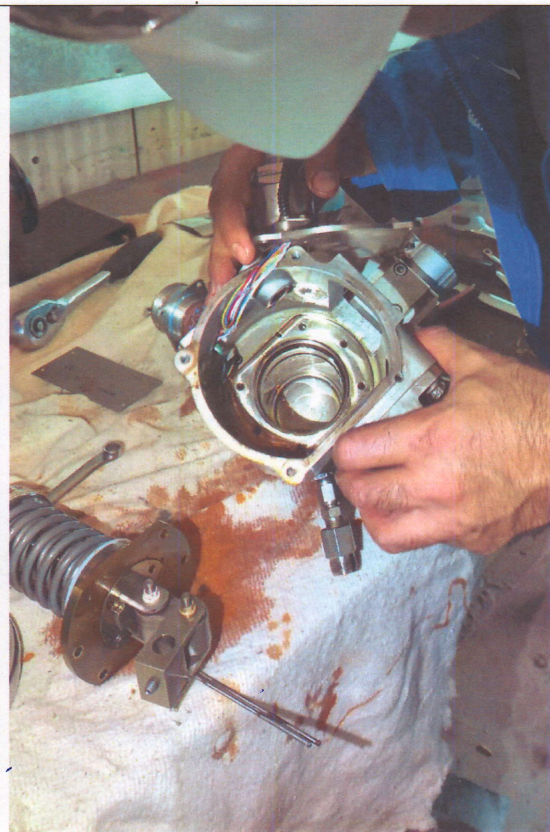



«Азиялық Газқұбыры» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Товарищество с ограниченной ответственностью «Азиатский Газопровод»
Asia Gas Pipeline Limited Liability Partnership

Начальник КС-1 / Head of CS-1

Чжао Шэньцю / Zhao Shengqui

Зам. Начальника КС-1 / Deputy head of CS-1

Бакен Н. / N. Baken

Ведущий инженер КС КС-1 /
Leading engineer CS of CS-1

Хасенов А. / A. Khassenov

Ведущий инженер по эксплуатации КС-1/
Leading engineer on operation of CS-1

Баккараев Т. / T. Bakkarayev
